


QUINDÍO



MINISTERIO DE TRANSPORTE



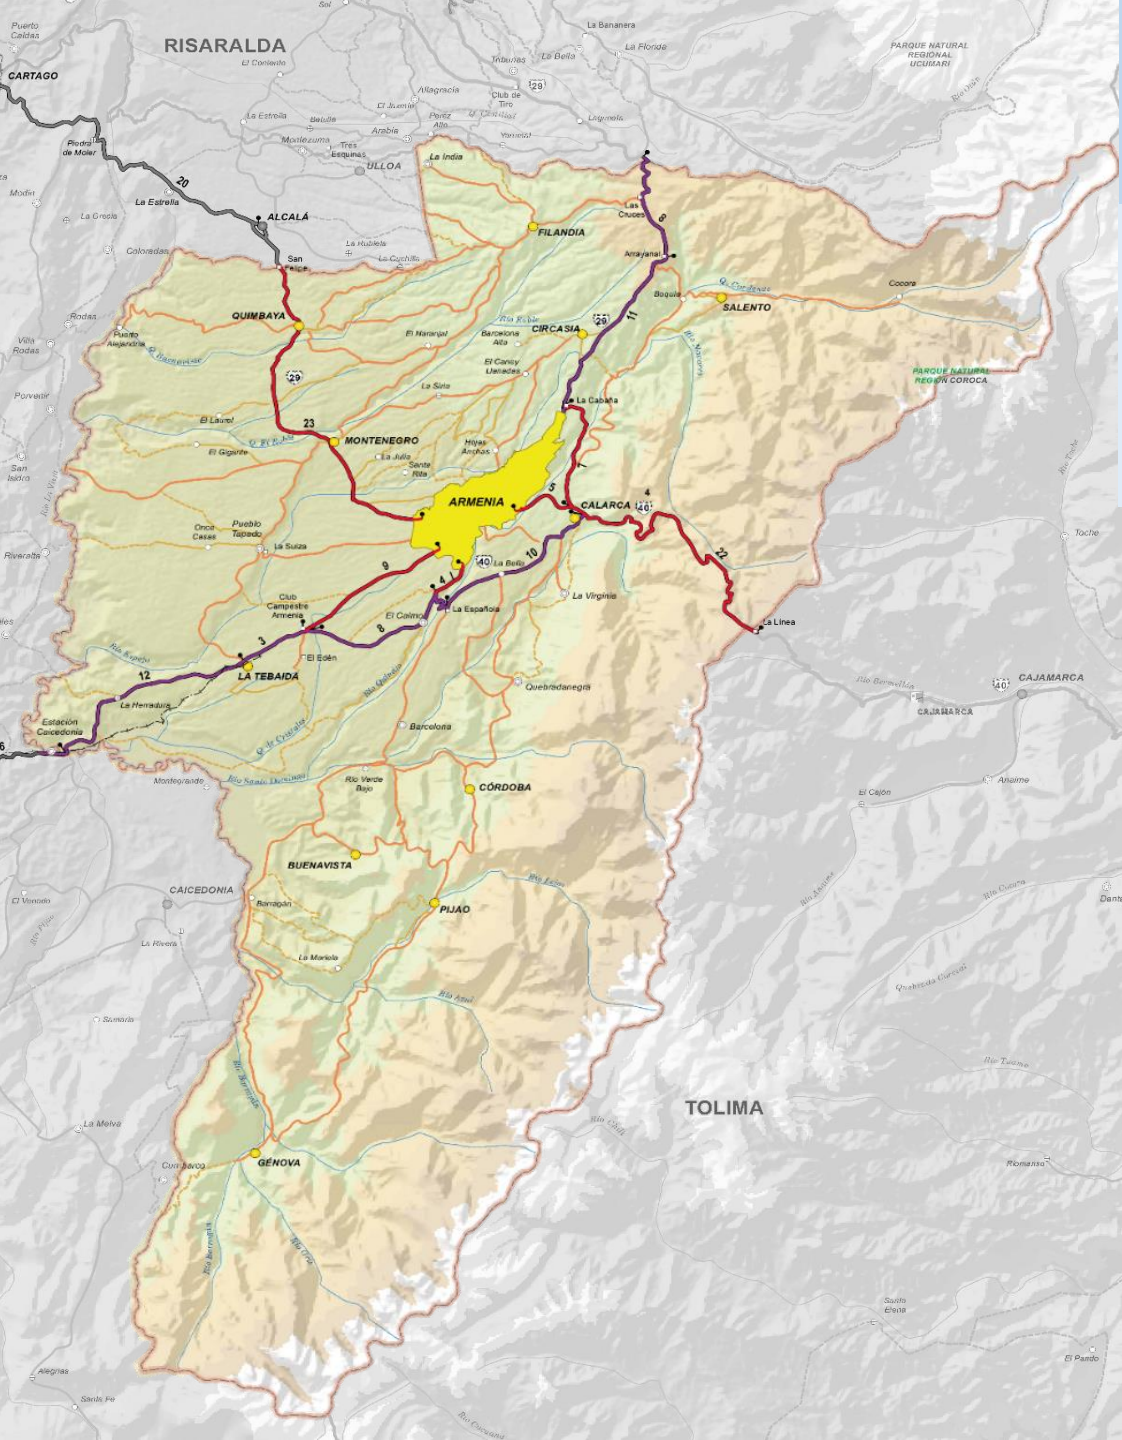

\$ 768.632 Millones
INVERSIÓN



MUNICIPIOS

12



**Km Vías
Intervenidas**

247



EMPLEOS

11.682

1. RED NACIONAL:	\$ 688.501
Proyectos generales	\$684.061
Mantenimientos	\$4.440
2. VIAS RURALES Y REGIONALES:	\$23.557
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$10.572
4. RED FÉRREA:	\$46.002

1. RED NACIONAL



\$ 688.501
Millones

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	ALCANCE (KM)	INVERSIÓN TOTAL
1	PROYECTOS GENERALES	8	3 ESTRUCTURACIÓN 1 CONTRATACIÓN 3 EJECUCIÓN 1 SUSPENDIDO	129	\$ 684.061
2	MANTENIMIENTOS	1	1 EJECUCIÓN	66	\$ 4.440
TOTAL		9		195	\$ 688.501

1.1. PROYECTOS GENERALES



\$ 684.061
Millones



129 Km

ITEM	CORREDOR	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
RED NACIONAL						129		\$ 684.061
1	CLUB CAMPESTRE, ARMENIA	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SECTOR UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA DE LA VÍA CLUB CAMPESTRE – ARMENIA RUTA 4002 DEPARTAMENTO DE QUINDÍO.	CONTRATO DE OBRA: 1599-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1722-2020	feb-21	-	1 PUENTE	63% SUSPENDIDO	\$ 2.513
2	CLUB CAMPESTRE, ARMENIA	TERMINACIÓN CICLO RUTA CLUB CAMPESTRE - ARMENIA VARIANTE CALARCÁ CIRCASIA (INTERCAMBIADOR DE CHAGUALA) REHABILITACIÓN CALZADA DERECHA CORREDOR MALIBÚ- TRES ESQUINAS	CONTRATO DE OBRA: 1780-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1727-2021	dic-21	dic-22	-	53%	\$ 21.703
3	SALENTO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EJE CAFETERO- SALENTO	CONVENIO DE OBRA: 1645-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1280-2022	-	-	3	CONTRATACIÓN	\$ 4.192
4	DOBLE CALZADA CALARCÁ - ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - CARTAGO	SEGUNDA CALZADA ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA QUIMBAYA	CONTRATO DE OBRA: 1904-2020 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1913-2020	mar-21	dic-22	KILÓMETROS A REHABILITAR: 47,8 KM KILÓMETROS A	14%	\$ 126.033
5	\$421.500 Millones	DOBLE CALZADA MONTENEGRO - CARTAGO	CONVENIO DE OBRA: 2177-2021	abr-22	OBRAS 2026 MANTENIMIENTO 2030	19	ESTRUCTURACIÓN	\$ 295.447
6	CAJAMARCA, CALARCÁ	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TÚNELES Y VÍA A CIELO ABIERTO	CONTRATO DE OBRA: 1175-2021 CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1173-2021	jun-21	dic-22	50	93%	\$ 220.019
7	PUEBLO TAPAO - PUERTO ESPEJO	REHABILITACION , MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO SECTOR ENTRE PUEBLO TAPAO Y PUERTO ESPEJO.	CONVENIO DE OBRA: 1274-2022	-	-	-	ESTRUCTURACIÓN	\$ 2.789
8	ARMENIA-CLUB CAMPESTRE	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VARIANTE CALARCÁ CIRCASIA CORREDOR ARMENIA CLUB CAMPESTRE AEROPUERTO	NÚMERO PROCESO: LP-DTE-SEP-006-2022	-	-	-	ESTRUCTURACIÓN	\$ 11.364

1.2. MANTENIMIENTOS



\$ 4.440
Millones



66 Km

ITEM	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
	RED NACIONAL				66		\$ 4.440
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS DEL DEPARTAMENTO	CONTRATO DE OBRA: 2103-2019, 2104-2019, 2418-2019	dic-19	dic-22	66	90%	\$ 4.440

2. VIAS RURALES Y REGIONALES



\$ 23.557
Millones

12 Municipios

NO.	PROGRAMA	PROYECTOS	ESTADO	INVERSIÓN	MUNICIPIOS
1	CONVENIOS COLOMBIA RURAL	7	5 FIRMADOS 2 CONTRATADOS	\$ 4.437	7
2	CONVENIOS ESPECIALES	1	1 EJECUCIÓN	\$ 14.000	4
3	OCAD PAZ	1	1 EJECUCIÓN	\$ 5.119	1
TOTAL		8		\$ 23.557	12

2.1. CONVENIOS COLOMBIA RURAL



\$ 4.437 Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMERO DE CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	BUENAVISTA	C.I LA PICOTA - LOS JUANES	2002-2021	ene-22	dic-22	4 ALCANTARILLAS Y 424 METROS DE PLACA HUELLA.	FIRMADO	\$ 762
2	CALARCÁ	CORREDOR TURISTICO DE LA PAZ	2003-2021	ene-22	dic-22	4 ALCANTARILLAS Y 190 ML DE PLACA HUELLA.	CONTRATACIÓN	\$ 482
3	CIRCASIA	CIRCASIA- AGUADEÑAS-VIGILANTE	2004-2021	ene-22	dic-22	2 ALCANTARILLAS Y 381 METROS DE PLACA HUELLA	CONTRATACIÓN	\$ 682
4	CORDOBA	CORREDOR RIO VERDE ALTO - MEDIA CARA	2006-2021	ene-22	dic-22	2 ALCANTARILLAS, 429 ML DE PLACA HUELLA	FIRMADO	\$ 682
5	FILANDIA	CORREGIMIENTO LA INDIA	2007-2021	ene-22	dic-22	1 BOX CULVERT	FIRMADO	\$ 582
6	MONTENEGRO	TAPAO-LA MONTAÑA-LA CEIBA-LA GUATEMALASAN JOSÉ-SAN PABLO	2008-2021	ene-22	dic-22	2 ALCANTARILLAS , 370 ML DE PLACA HUELLA	FIRMADO	\$ 622
7	GÉNOVA	VIA GRIS	2025-2021	ene-22	dic-22	4 ALCANTARILLAS, 280 ML DE PLACA HUELLA	FIRMADO	\$ 622

2.2. CONVENIOS ESPECIALES



\$ 14.000
Millones

ITEM	MUNICIPIO	VÍA PRIORIZADA	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	CONVENIO EJÉRCITO NACIONAL	1609-2020	nov-21	dic-22	MANTENIMIENTO DE 580 KM VÍAS TERCARIAS PRIORIZADAS	5%	\$ 14.000

2.3. OCAD PAZ



\$ 5.119
Millones

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	PIJAO	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO	oct-19	oct-22	2,37 KM DE PLACA HUELLA 11 ALCANTARILLAS 2 MUROS DE CONTENCIÓN	99%	\$ 5.119

3. ESTUDIOS Y DISEÑOS



\$ 10.572
Millones



138 Km

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
						138		\$ 10.572
1	CALARCÁ, ARMENIA, LA PAILA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DOBLE CALZADA	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2753-2019 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2714-2019	feb-20	ago-22	74	TERMINADO	\$ 6.622
2	ARMENIA, CARTAGO, CALARCÁ	CONECTIVIDAD ARMENIA CARTAGO CALARCÁ	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2197-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2238-2021	nov-20	jun-22	53	TERMINADO	\$ 3.021
2	ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA, CARTAGO, CALARCÁ, CLUB CAMPESTRE	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VARIANTE ARMENIA	CONTRATO DE CONSULTORIA: 2197-2021 CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2238-2021	feb-22	nov-22	11	32%	\$ 929

4. VÍAS VERDES

 **\$ 46.002**
Millones

 **47 Km**

ITEM	MUNICIPIO	PROYECTO	NÚMEROS CONTRATOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ALCANCE (KM)	ESTADO	INVERSIÓN TOTAL
1	SALENTO	CORREDOR FERREO SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA - VÍAS VERDES	CONTRATO DE OBRA: 2068-2021 PROCESO DE INTERVENTORIA: CMA-DTE-SEP-199-2021	dic-21	dic-30	47	EJECUCIÓN	\$ 46.002
